ACTIVIDAD 4 (ESCENARIOS DE CRISIS PRESUPUESTAL)

1. Objetivo de la actividad

Desarrollar la capacidad de gestionar una crisis presupuestal mediante decisiones justificadas que permitan recuperar la viabilidad del proyecto, controlar los costos, proteger la calidad técnica, gestionar los cambios y comunicar de manera efectiva las decisiones a los interesados.

El reto no consiste únicamente en reducir costos. Cada equipo deberá demostrar que puede mantener el valor esencial de su solución, cumplir los requisitos críticos y establecer mecanismos para controlar la recuperación del proyecto.

2. Reglas generales de la simulación


Todos los equipos deben asumir las siguientes condiciones:

- El proyecto presenta el sobrecosto específico indicado en su escenario.
- No se puede solicitar presupuesto adicional.
- No se puede ampliar el tiempo del sprint actual.
- Se permite reducir o aplazar funcionalidades, cambiar el enfoque técnico y repriorizar el MVP.
- No se permite eliminar controles esenciales de seguridad, integridad, calidad o confiabilidad para reducir costos.
- Toda decisión debe sustentarse en datos, estimaciones, criterios técnicos y consecuencias identificables.
- Los costos que no puedan determinarse con la información disponible deben identificarse como pendientes de validación, sin inventar cotizaciones.

En el documento aparecen los cuatro proyectos con escenarios equivalentes para Vision Care, Silvia, Torre Satori y WAMA, conservando la lógica de la actividad y diferenciando estos escenarios adaptados de los casos originales.

Escenarios de crisis presupuestal para todos los proyectos

1. Vision Care — Sobrecostos en seguridad, datos clínicos e inteligencia artificial

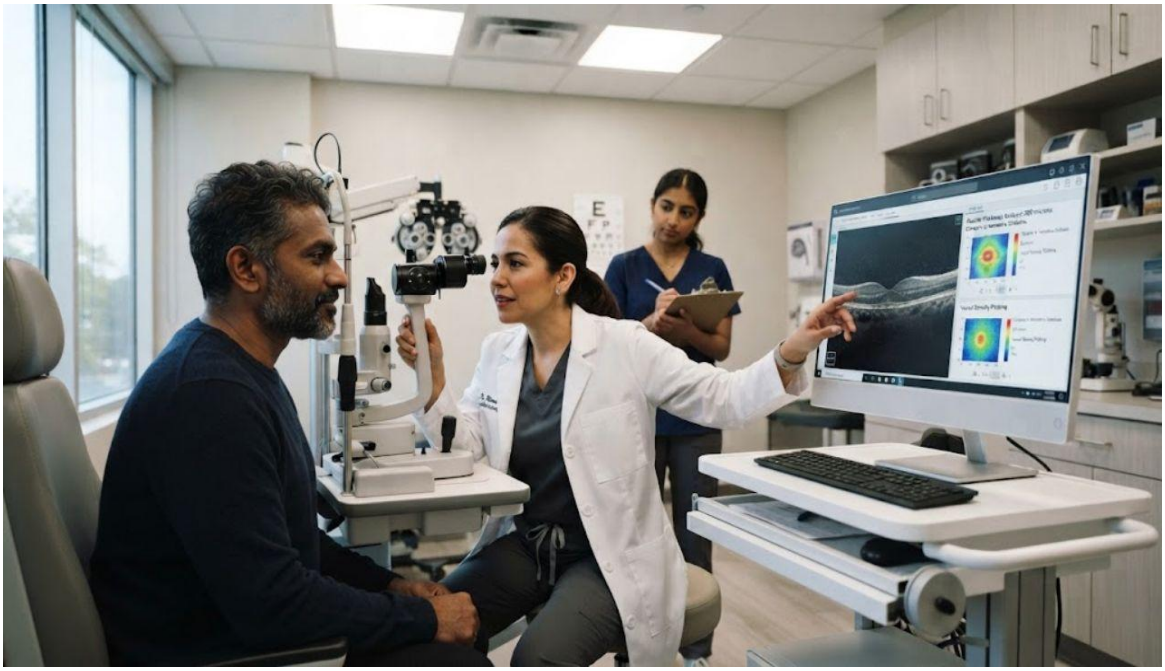

Crisis: El costo de proteger y procesar la información clínica supera lo previsto

Sobrecosto: 35%

El equipo descubre que el desarrollo de las historias clínicas, las validaciones de datos y la transcripción mediante IA requieren más esfuerzo y recursos de los presupuestados.

Situación de crisis:

Durante la revisión técnica, el equipo identifica que necesita corregir inconsistencias en los datos, fortalecer los controles de acceso y validar la calidad de las transcripciones. El costo de estas actividades eleva el presupuesto estimado en un 35%. No hay dinero adicional y el sprint actual no puede ampliarse.

Impactos potenciales

- Registro de información clínica incorrecta.
- Exposición de datos sensibles.
- Retrasos en la validación con el oftalmólogo piloto.
- Entrega de funcionalidades insuficientemente probadas.
- Aumento de los costos de procesamiento y operación de servicios de IA.

Reto gerencial y técnico

¿Cómo recuperar la viabilidad presupuestal sin comprometer la integridad, la confidencialidad y la confiabilidad de la información clínica?

El equipo de proyecto deberá evaluar la posibilidad de:

- Priorizar el registro clínico y las validaciones indispensables para el piloto.
- Aplazar funcionalidades administrativas secundarias.
- Limitar inicialmente la transcripción con IA a un flujo controlado y validado por un profesional, si es técnicamente viable.
- Revisar el consumo de servicios externos y simplificar componentes de la solución sin debilitar los controles necesarios.

Requisitos adicionales y obligatorios

A. Control de cambios: Identificar qué requisitos o funcionalidades se modifican, qué dependencias tienen y cómo se actualizarán el backlog y los criterios de aceptación.

B. Riesgos y calidad: Explicar cómo se validará la exactitud de los datos y qué controles de seguridad deben permanecer activos.

C. Control presupuestal: Demostrar cuánto se espera ahorrar, qué costos se mantienen y qué costos futuros podrían generarse.

D. Indicadores de recuperación: Proponer tres indicadores, por ejemplo:

- Costo proyectado del incremento frente al presupuesto disponible.
- Porcentaje de criterios de aceptación clínicos cumplidos.
- Número de defectos críticos abiertos relacionados con datos o seguridad.

E. Comunicación: Redactar un mensaje para el patrocinador explicando el ajuste de alcance, los riesgos controlados y las limitaciones del piloto.

Objeción del patrocinador

“El ahorro propuesto parece depender de reducir las validaciones. ¿Cómo garantizan que el sistema no entregue información clínica incorrecta ni exponga datos sensibles?”

El equipo de proyecto deberá responder con controles, pruebas y evidencias concretas.

2. Silvia — Sobrecostos en el agente conversacional y la integración con inventario



Crisis: El bot inteligente cuesta más de lo previsto

Sobrecosto: 40%

La integración con el inventario en tiempo real y el consumo de servicios de IA incrementan el esfuerzo de desarrollo y el costo de operación.

Situación de crisis:

Al probar el agente conversacional para la tienda o el club deportivo, el equipo encuentra dificultades para consultar el inventario actualizado, responder preguntas variadas y transferir conversaciones a una persona. Las pruebas adicionales y el uso de IA elevan el presupuesto un 40%.

Impactos potenciales

- Respuestas incorrectas sobre la disponibilidad de productos.
- Incremento de los costos por mensajes y consultas a servicios de IA.
- Mala experiencia del usuario.
- Riesgo de no terminar las funcionalidades prioritarias del MVP.
- Costos recurrentes superiores a los previstos.

Reto gerencial y técnico

¿Cómo mantener la utilidad del agente conversacional sin financiar una automatización completa desde el primer sprint?

El equipo de proyecto deberá evaluar la posibilidad de:

- Limitar el agente a las consultas de mayor valor.
- Priorizar una integración confiable con el inventario.
- Establecer límites de consumo de IA y utilizar respuestas predefinidas cuando resulte adecuado.
- Mantener la transferencia a un asesor humano.
- Aplazar funciones conversacionales secundarias.

Requisitos adicionales y obligatorios

A. Control de cambios: Identificar qué funciones conversacionales se conservan y cuáles se aplazan, explicando el impacto sobre el usuario y las dependencias técnicas.

B. Control operativo: Definir cómo se evitarán respuestas basadas en información desactualizada y cómo se controlará el consumo de servicios externos.

C. Control presupuestal: Diferenciar los costos de implementación de los costos recurrentes de mensajería, IA, infraestructura y mantenimiento que correspondan al diseño propuesto.

D. Indicadores de recuperación: Proponer tres indicadores, por ejemplo:

- Costo proyectado del incremento frente al presupuesto disponible.
- Porcentaje de consultas prioritarias respondidas correctamente.
- Costo estimado por conversación o consulta, con sus supuestos de uso.


E. Comunicación: Explicar al patrocinador qué automatizaciones se aplazan, qué capacidad funcional se conserva y cuáles son las limitaciones del MVP.

Objeción del patrocinador

“Si reducimos el uso de IA y simplificamos las conversaciones, ¿qué valor diferencial conserva la solución frente a un sistema de respuestas predefinidas?”

El equipo de proyecto deberá demostrar cómo el MVP resuelve una necesidad real y cómo se validará su utilidad.

3. Torre Satori — Sobrecostos en reservas, sincronización y operación hotelera

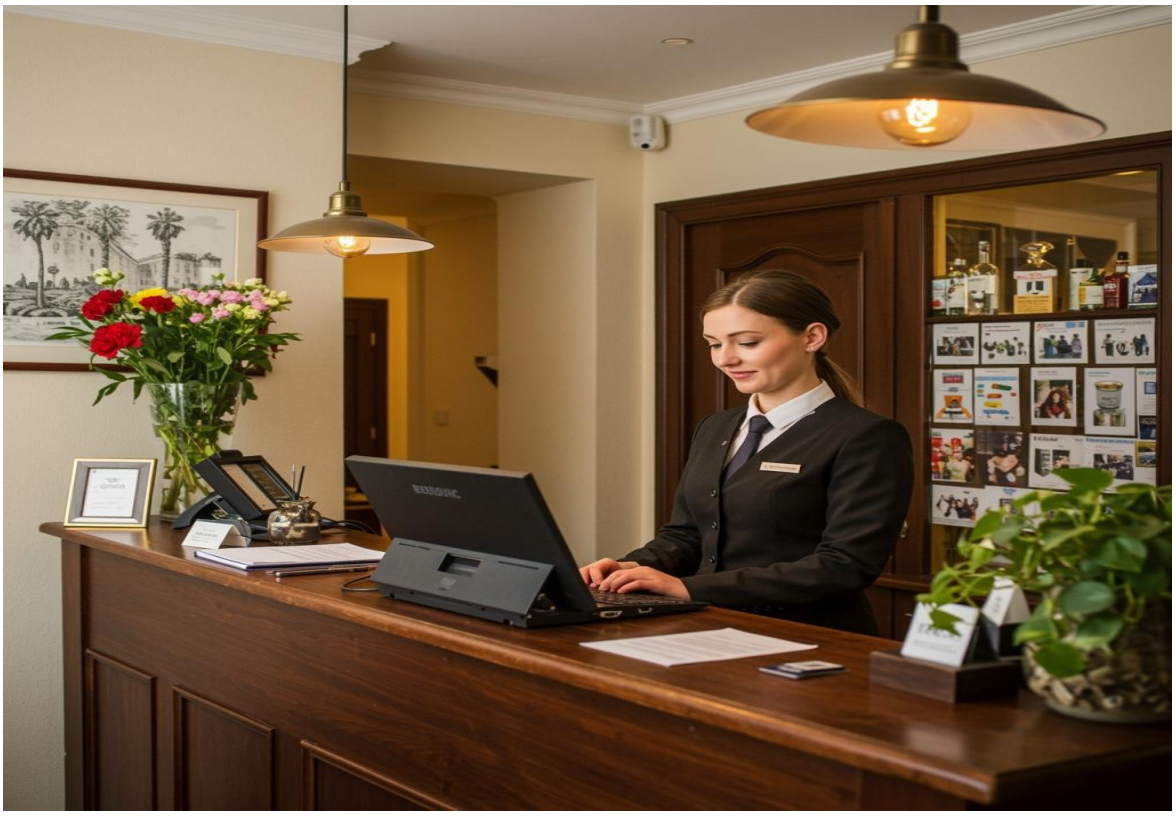

Crisis: Las reservas confiables requieren más desarrollo e infraestructura

Sobrecosto: 30%

La construcción del sistema de gestión hotelera revela mayores costos de validación de reservas, prevención de duplicados e integración con el canal de mensajería.

Situación de crisis:

Durante las pruebas del sistema, dos usuarios pueden intentar reservar la misma habitación o las actualizaciones de disponibilidad no se reflejan correctamente. Corregir estas fallas exige más desarrollo y pruebas de las previstas. El presupuesto aumenta un 30%.

Impactos potenciales

- Reservas duplicadas.
- Errores de disponibilidad.
- Inconvenientes durante el check-in y el check-out.
- Pérdida de confianza del personal y los huéspedes.
- Incremento de las actividades de soporte y corrección.

Reto gerencial y técnico

¿Cómo mantener un proceso de reservas confiable si el equipo no puede desarrollar todos los módulos inicialmente planeados?

El equipo de proyecto deberá evaluar la posibilidad de:

- Priorizar el registro de reservas, la disponibilidad y la prevención de duplicados.
- Aplazar reportes avanzados y funcionalidades administrativas no esenciales.
- Simplificar el chatbot a consultas básicas o confirmaciones, si el diseño lo permite.
- Simplificar los módulos secundarios sin comprometer los requisitos indispensables para la operación prevista.

Requisitos adicionales y obligatorios

A. Control de cambios: Identificar las funcionalidades que se aplazan y comprobar que no son dependencias indispensables del flujo prioritario de reservas.

B. Control de calidad: Especificar las pruebas necesarias para demostrar que el sistema evita reservas duplicadas y conserva la consistencia de la información.

C. Control presupuestal: Demostrar el ahorro estimado y revisar si el ajuste genera costos posteriores de operación, soporte o integración.

D. Indicadores de recuperación: Proponer tres indicadores, por ejemplo:

- Costo proyectado del incremento frente al presupuesto disponible.
- Porcentaje de pruebas críticas de reserva aprobadas.
- Número de defectos críticos abiertos relacionados con disponibilidad o duplicidad.

E. Comunicación: Explicar al patrocinador qué procesos hoteleros estarán disponibles al finalizar el sprint y cuáles se aplazarán.

Objeción del patrocinador

“Entiendo el ahorro, pero una reserva duplicada puede afectar directamente al hotel. ¿Qué evidencia demuestra que la versión reducida sigue siendo confiable?”

El equipo deberá presentar el flujo de reservas y las pruebas que considera obligatorias antes de aceptar el incremento.

4. WAMA — Sobrecostos en verificación, compatibilidad y seguridad



Crisis: Verificar usuarios y proteger los acuerdos supera el presupuesto

Sobrecosto: 35%

La verificación de antecedentes, el algoritmo de compatibilidad y los mecanismos para proteger los datos y acuerdos digitales generan costos superiores a los estimados.

Situación de crisis:

Al preparar el piloto, el equipo descubre que los servicios de verificación tienen costos o condiciones de integración no contemplados. Además, ajustar el algoritmo de compatibilidad y probar la seguridad de los datos requiere más esfuerzo técnico. El presupuesto aumenta un 35%.

Impactos potenciales

- Perfiles incompletos o información insuficiente para decidir.
- Riesgos de privacidad y exposición de datos personales.
- Menor confianza entre las personas que buscan compartir vivienda.
- Imposibilidad de desarrollar todas las funcionalidades previstas.
- Dependencia de servicios externos con costos aún no confirmados.

Reto gerencial y técnico

¿Cómo validar la propuesta de valor de WAMA sin asumir desde el comienzo todos los costos de automatización y verificación?

El equipo de proyecto deberá evaluar la posibilidad de:

- Priorizar la creación de perfiles y un mecanismo básico y explicable de compatibilidad.
- Aplazar la gamificación y otras funciones secundarias.
- Evaluar un proceso inicial de verificación viable y transparente.
- Mantener los controles de privacidad y seguridad necesarios.
- Posponer integraciones externas costosas hasta validar su necesidad.

Requisitos adicionales y obligatorios

A. Control de cambios: Definir qué capacidades se conservan en el MVP y cuáles se aplazan, explicando el impacto sobre la propuesta de valor.

B. Riesgos y calidad: Identificar los riesgos de privacidad, seguridad y confianza que deben controlarse. No presentar un proceso simplificado como si fuera una verificación completa de antecedentes.

C. Control presupuestal: Distinguir los costos de desarrollo, operación y servicios externos, e identificar los valores pendientes de cotización.

D. Indicadores de recuperación: Proponer tres indicadores, por ejemplo:

- Costo proyectado del incremento frente al presupuesto disponible.
- Porcentaje de pruebas críticas de privacidad y seguridad aprobadas.
- Porcentaje de perfiles piloto que completan correctamente el flujo prioritario definido por el equipo.

E. Comunicación: Explicar al patrocinador qué puede afirmar la solución sobre compatibilidad y verificación, qué limitaciones conserva y qué capacidades se aplazan.

Objeción del patrocinador

“Si simplificamos la verificación de usuarios, ¿cómo evitamos generar una falsa sensación de seguridad entre las personas que utilizarán la plataforma?”

El equipo deberá explicar las limitaciones del MVP, los controles aplicados y la forma transparente de comunicar su alcance.

Entregable: Ficha gerencial de recuperación del proyecto

Todos los equipos de proyecto deben presentar una única ficha ejecutiva que contenga:

1. Diagnóstico presupuestal

- Presupuesto inicial.
- Porcentaje de sobrecosto.
- Costo proyectado antes del ajuste.
- Causas del sobrecosto y partidas afectadas.
- Presupuesto disponible.

2. Decisión de alcance

Clasificar las funcionalidades en:

- Se conservan.
- Se simplifican.
- Se aplazan o eliminan.

Justificar cada decisión por su valor, costo, dependencia técnica y riesgo.

3. Ajuste presupuestal

Presentar los costos antes y después del ajuste, indicando cantidades, costos unitarios, supuestos y fuentes de estimación.

El presupuesto revisado debe caber en el presupuesto disponible. Diferenciar los ahorros reales de los costos simplemente aplazados o trasladados a la operación futura.

4. MVP resultante

Describir qué podrá hacer la solución al finalizar el sprint, cuáles requisitos críticos cumplirá y qué funcionalidades quedarán pendientes.

5. Control integrado de cambios

Documentar:

- Cambio solicitado o propuesto.
- Justificación.
- Impacto en alcance, costo, tiempo, calidad y riesgos.
- Dependencias afectadas.
- Actualización del backlog y criterios de aceptación.

6. Riesgos y calidad

Incluir los principales riesgos derivados del ajuste, su impacto, las medidas de control y las pruebas indispensables antes de aceptar el incremento.

7. Indicadores de seguimiento

Definir tres indicadores. Para cada uno, especificar:

- Qué mide.
- Cómo se calcula o verifica.
- Meta esperada.
- Frecuencia de revisión.
- Acción correctiva si no se cumple.

8. Comunicación gerencial

Redactar un mensaje ejecutivo dirigido al patrocinador que explique la crisis, la decisión, el alcance resultante, los riesgos controlados y las limitaciones que deben aceptarse.

9. Defensa de la decisión

Prepararse para responder a la objeción específica del escenario asignado y demostrar que la propuesta es técnica y presupuestalmente coherente.
